

BITÁCORA DE OBRA					<div>CONSORCIO</div> <div><b>ASIS</b></div> <div>INTERVENTORIA</div>					
DIA:	62,00	FECHA (dd/mm/aaaa):	3/12/2025							
PROYECTO:	TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SONSON		LOCALIZACIÓN		MH C58 - MH C 57					
INTERVENTOR:	CONSORCIO ASIS		CONSTRUCTOR:		GRUPO DANЕК					
DATOS DE OBRA										
INGENIERO	3	TOTAL PERSONAL EN OBRA	LLUVIA		EQUIPOS/MAQUINARIA			RECEPCION MATERIAL		
TECNOLOGO	2		SI		CONCEPTO	UN	CANT.	CONCEPTO	UN	CANT.
PROF. AMBIENTAL	1		NO	X	NIVEL AUTOMATICO	UND	1	TUBO NOVAFORT 12"	UND	0,00
PROF. SOCIAL	2				ESTACION TOTAL	UND	1	TUBO NOVAFORT 6"	UND	0,00
TOPOGRAFO	1		duración(hr)	RETROEXCAVADORA	UND	1	SILLA YEE 12"X6"	UND	0,00	
CADENERO	1			VOLQUETA 8m³	UND	2				
OFICIALES	5			CANGUROS	UND	1				
AYUDANTES	15			CONCRETADORA	UND	1	CODO DE 45° 6"	UND	0,00	
OPERADORES	4									
PROF. SST	1							TRITURADO	m³	16,00
MAESTRO DE OBRA	1	36								
							MATERIAL DE PRESTAMO	m³	72,00	
							BASE	m³	16,00	
ACTIVIDADES EJECUTADAS										
A continuación se presentan las actividades realizadas con su respectiva cantidad:										
ITEM	ACTIVIDAD						UNIDAD	CANT.		
1.3.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Su medida será en sitio (brecha). No incluye entibado. Incluye acarreo interno.						m³	101,37		
1.3.3	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 2-4 m, humedo. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Su medida será en sitio (brecha). No incluye entibado. Incluye acarreo interno.						m³	3,04		
1.3.7	CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material proveniente de las EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA DEMOLICIONES Y OTROS. Incluye transportes internos, paleros, derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría.						m³	135,74		
1.3.9	LLENOS BASE, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la base, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. Incluye ensayo próctor modificado y chequeo de densidad en campo. Su medida será en sitio (brecha).						m³	13,18		
1.3.10	LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. Incluye ensayo próctor modificado y chequeo de densidad en campo. Su medida será en sitio (brecha).						m³	10,14		
1.3.11	LLENOS EN TRITURADO. Incluye el suministro, transporte, colocación del triturado, el transporte interno. Y su medida será en sitio.						m³	13,39		
1.3.12	LLENOS EN MATERIAL DE PRESTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. Incluye ensayo próctor modificado y chequeo de densidad en campo. Su medida será en sitio (brecha).						m³	74,34		
1.4.1	Entibado temporal.						m²	112,64		
1.6.8	Perforada y abocada de MH exis. para nueva tub. y resane, menor o igual a 400 mm (unidad).						UND	1,00		
1.7.1	Instalación de tubería alcantarillado novafort 315mm.						m	56,32		
1.8.1	Suministro y transporte de tubería alcantarillado novafort 315mm.						m	56,32		
OBSERVACIONES:										
Se continuo con las labores de ejecución de obra en los frentes ubicados en los MH C58 - MH C 57. Las actividades desarrolladas incluyeron trabajos de intervención en infraestructura bajo los estándares técnicos requeridos.										

BITÁCORA DE OBRA				<div>CONSORCIO</div> <div><b>ASIS</b></div> <div>INTERVENTORIA</div>
DIA:	62,00	FECHA (dd/mm/aaaa):	3/12/2025	

PROYECTO:	TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN	LOCALIZACIÓN	MH C58 - MH C 57
INTERVENTOR:	CONSORCIO ASIS	CONSTRUCTOR:	GRUPO DANЕК

#### REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIGURA 1.



FIGURA 2.

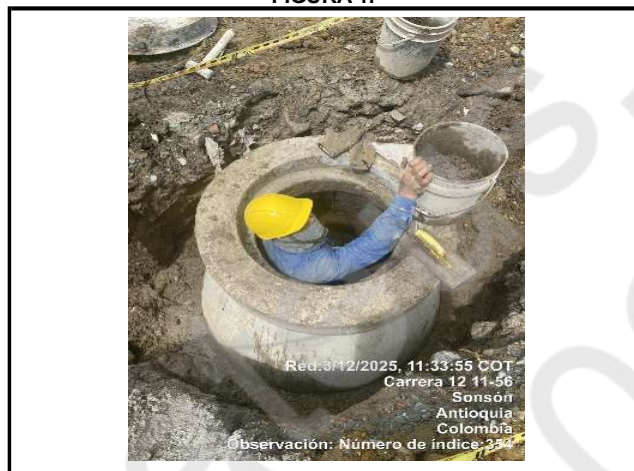


FIGURA 3.



FIGURA 4.

Firma Residente de Interventoría	
Nombre:	

Firma Residente de Obra	
Nombre:	
